



## B 83 Steinmühle

**Sachstandsmitteilung vom 2.08.2019**

Das haben wir gemacht:

Die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens für die gesamten Hangsicherungsmaßnahmen liegen öffentlich aus.

Die Arbeiten im Hang werden fortgeführt. Zuerst wurden Anker im Bereich der gestörten „gelbem Zone“ gebohrt.




Während der Sommermonate und wegen der exponierten Südhanglage mussten die Arbeiten bei starker Sonneneinstrahlung über die Mittagszeit unterbrochen und in die Nachmittags- und Abendstunden verlagert. Die Oberflächentemperaturen des Gesteins an dunkleren Partien betragen zeitweilig über 80 °C.

An den Ankern wurde als nächstes die Bewehrung befestigt und die umliegenden Bereiche abgedeckt. Beim Spritzbeton fällt unweigerlich Material zu Boden, der wieder entfernt werden muss.



Damit Wasser aus den Klüften weiterhin austreten kann, wurden Drainagen eingebaut.



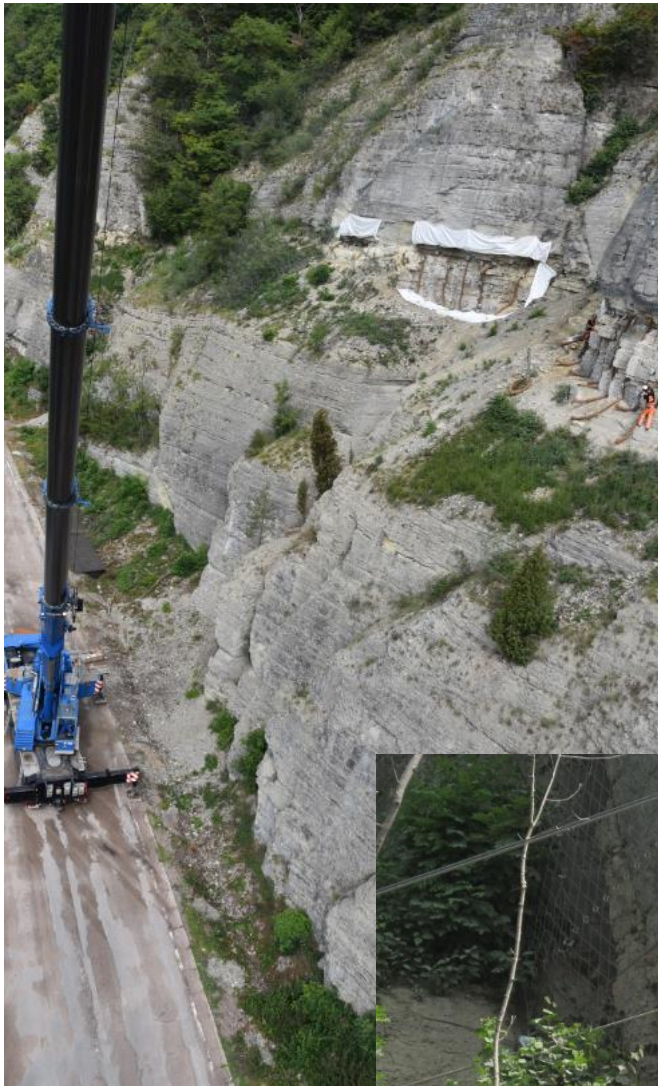

Nach den Vorbereitungen  
wird der Spritzbeton auf-  
getragen.



Nr. 20190010  
Markus Brockmann  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
[poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de)

Die Flächen sind fertig bearbeitet. Die Spritzbetonmengen wurden auf ein Minimum beschränkt.



Der natürliche Farbton der „gelben Zone“ wurde gut getroffen. Im Laufe der Zeit wird sich auf der frischen Oberfläche eine gewünschte „Patina“ bilden.



Nr. 20190010  
Markus Brockmann  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
